


Nr.	Vorgangssymbol	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	06. Apr '09	13. Apr '09	20. Apr '09	27. Apr '09	04. Mai '09	11. Mai '09
1		Urteilsspruch (Annahme)	0 Tage	Mo 01.06.09	Mo 01.06.09						
2											
3		Konzept Zwischenphase	33 Tage	Mi 15.04.09	Fr 29.05.09						
4		Vorbereitung und Start	3 Tage	Mi 15.04.09	Fr 17.04.09						
5		Leistungsangebot	14 Tage	Mo 20.04.09	Do 07.05.09						
6		Festlegung Mindestleistungsniveau	14 Tage	Mo 20.04.09	Do 07.05.09						
7		Aufbereitung Leistungsangebot	14 Tage	Mo 20.04.09	Do 07.05.09						
8		Leistungsindividualisierung für Mitglieder	14 Tage	Mo 20.04.09	Do 07.05.09						
9		WS Leistungskatalog	1 Tag	Mo 27.04.09	Mo 27.04.09						
10		Testpriorisierung	1 Tag	Do 30.04.09	Do 30.04.09						
11		WS Priorisierung	1 Tag	Di 05.05.09	Di 05.05.09						
12		Evaluierung der Priorisierung	1 Tag	Do 07.05.09	Do 07.05.09						
13		Finanzierungsmodell	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
14		Mitgliederbeiträge	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
15		Projektfinanzierung	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
16		Absichtserklärung Bund	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
17		Personalbesetzung	7 Tage	Do 30.04.09	Fr 08.05.09						
18		Arbeitssitzung mit Arbeitsrechtler	1 Tag	Do 30.04.09	Do 30.04.09						
19		Integration mit Org. Entwurf	6 Tage	Fr 01.05.09	Fr 08.05.09						
20		Entwurf Organisation	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
21		Entwurf Akquisitionspapier Branche	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
22		Präambel	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
23		Zwischenphase	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
24		Leistungsangebot	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
25		Angestrebte Mitgliederstruktur	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
26		Finanzierung	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
27		New Org	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
28		Leistungsangebot	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
29		Angestrebte Mitgliederstruktur	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
30		Finanzierung	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
31		Finanzierungsbeitrag	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						



Projekt: Masterplan NewOrg 090415
Datum: Mo 20.04.09

Vorgang

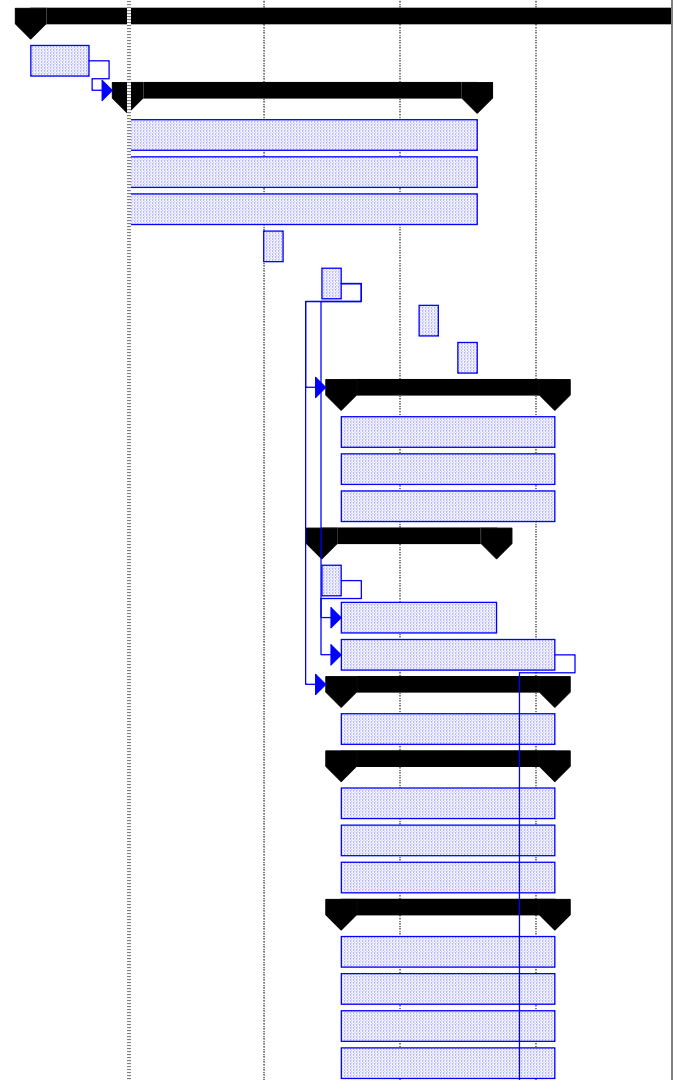

Meilenstein



Externe Vorgänge



Unterbrechung



Sammelvorgang



Externer Meilenstein



In Arbeit




Projektsammelvorgang



Stichtag



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	06. Apr '09	13. Apr '09	20. Apr '09	27. Apr '09	04. Mai '09	11. Mai '09
32	Mitbestimmungsrechte	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
33	Rechtliche Bindung	7 Tage	Fr 01.05.09	Mo 11.05.09						
34	Statusbericht für Klausurtagung	0 Tage	Mo 11.05.09	Mo 11.05.09						
35	Klausurtagung HAF Verw. Rat, Plattform	1 Tag	Fr 15.05.09	Sa 16.05.09						
36	Ausgestaltung Organisation	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
37	Rechtliche Konstruktion	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
38	Mitgliederverträge	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
39	Gesellschaftsrecht	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
40	Planung Infrastruktur	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
41	Berichtserstellung und Abstimmung	5 Tage	Mo 25.05.09	Fr 29.05.09						
42	Abnahme des Konzepts	0 Tage	Fr 29.05.09	Fr 29.05.09						
43										
44										
45	Akquisition Mittel Zwischenphase	100 Tage	Mo 18.05.09	Fr 02.10.09						
46	Identifikation Zielgruppe	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
47	Erstansprache Zielgruppe	5 Tage	Mo 18.05.09	Fr 22.05.09						
48	Einwerben der Mittel	100 Tage	Mo 18.05.09	Fr 02.10.09						
49	Veranstaltung BMELV, Plattform	3 Tage?	Di 16.06.09	Do 18.06.09						
50										
51	Start Zwischenphase	411 Tage	Mo 01.06.09	Mo 27.12.10						
52	Urteilsanalyse	10 Tage	Mo 01.06.09	Fr 12.06.09						
53	Übergangsplanung	20 Tage	Mo 15.06.09	Fr 10.07.09						
54	Liquidität	20 Tage	Mo 15.06.09	Fr 10.07.09						
55	Personalübergang	20 Tage	Mo 15.06.09	Fr 10.07.09						
56	Kommunikation in die Branche	20 Tage	Mo 15.06.09	Fr 10.07.09						
57	HAF Medien	20 Tage	Mo 15.06.09	Fr 10.07.09						
58	Gründung	1 Tag	Mo 13.07.09	Mo 13.07.09						
59	Leistungserbringung	380 Tage	Di 14.07.09	Mo 27.12.10						
60										
61	Konzept NewOrg	135 Tage	Di 14.07.09	Mo 18.01.10						
62	Leistungsangebot	10 Tage	Di 14.07.09	Mo 27.07.09						

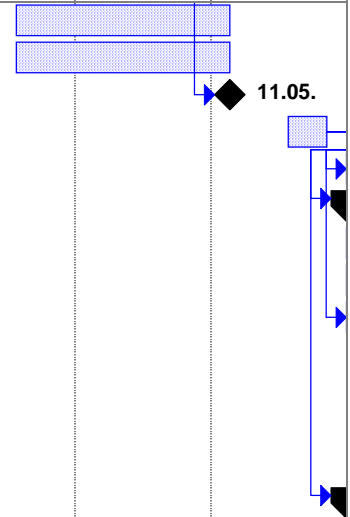

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	06. Apr '09	13. Apr '09	20. Apr '09	27. Apr '09	04. Mai '09	11. Mai '09
63		Aufbau-Ablauforg.	10 Tage	Di 28.07.09	Mo 10.08.09						
64		Mittelbedarf	5 Tage	Di 11.08.09	Mo 17.08.09						
65		Finanzierungsmodell	5 Tage	Di 18.08.09	Mo 24.08.09						
66		Businessplan	5 Tage	Di 25.08.09	Mo 31.08.09						
67		Abstimmung mit Mitgliedern Zw.Phase	100 Tage	Di 01.09.09	Mo 18.01.10						
68											
69		Gewinnung Mitglieder NewOrg	190 Tage	Di 19.01.10	Mo 11.10.10						
70											
71											
72		Start NewOrg	0 Tage	Mo 27.12.10	Mo 27.12.10						
73											
74		Forstchefkonferenz	0 Tage	Do 23.04.09	Do 23.04.09			◆ 23.04.			
75		VDP / Düsseldorf	0 Tage	Do 30.04.09	Do 30.04.09				◆ 30.04.		
76		BSHD / Berlin	0 Tage	Do 30.04.09	Do 30.04.09				◆ 30.04.		
77		Fostausschuss komm. Verbände	0 Tage	Fr 08.05.09	Fr 08.05.09					◆ 08.05.	
78		Forstausschuss Deutscher Kommunalwald	0 Tage	Mo 11.05.09	Mo 11.05.09						◆ 11.05.

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
Datum: Mo 20.04.09

Vorgang



Meilenstein



Externe Vorgänge



Unterbrechung



Sammelvorgang



Externer Meilenstein



In Arbeit




Projektsammelvorgang




Stichtag



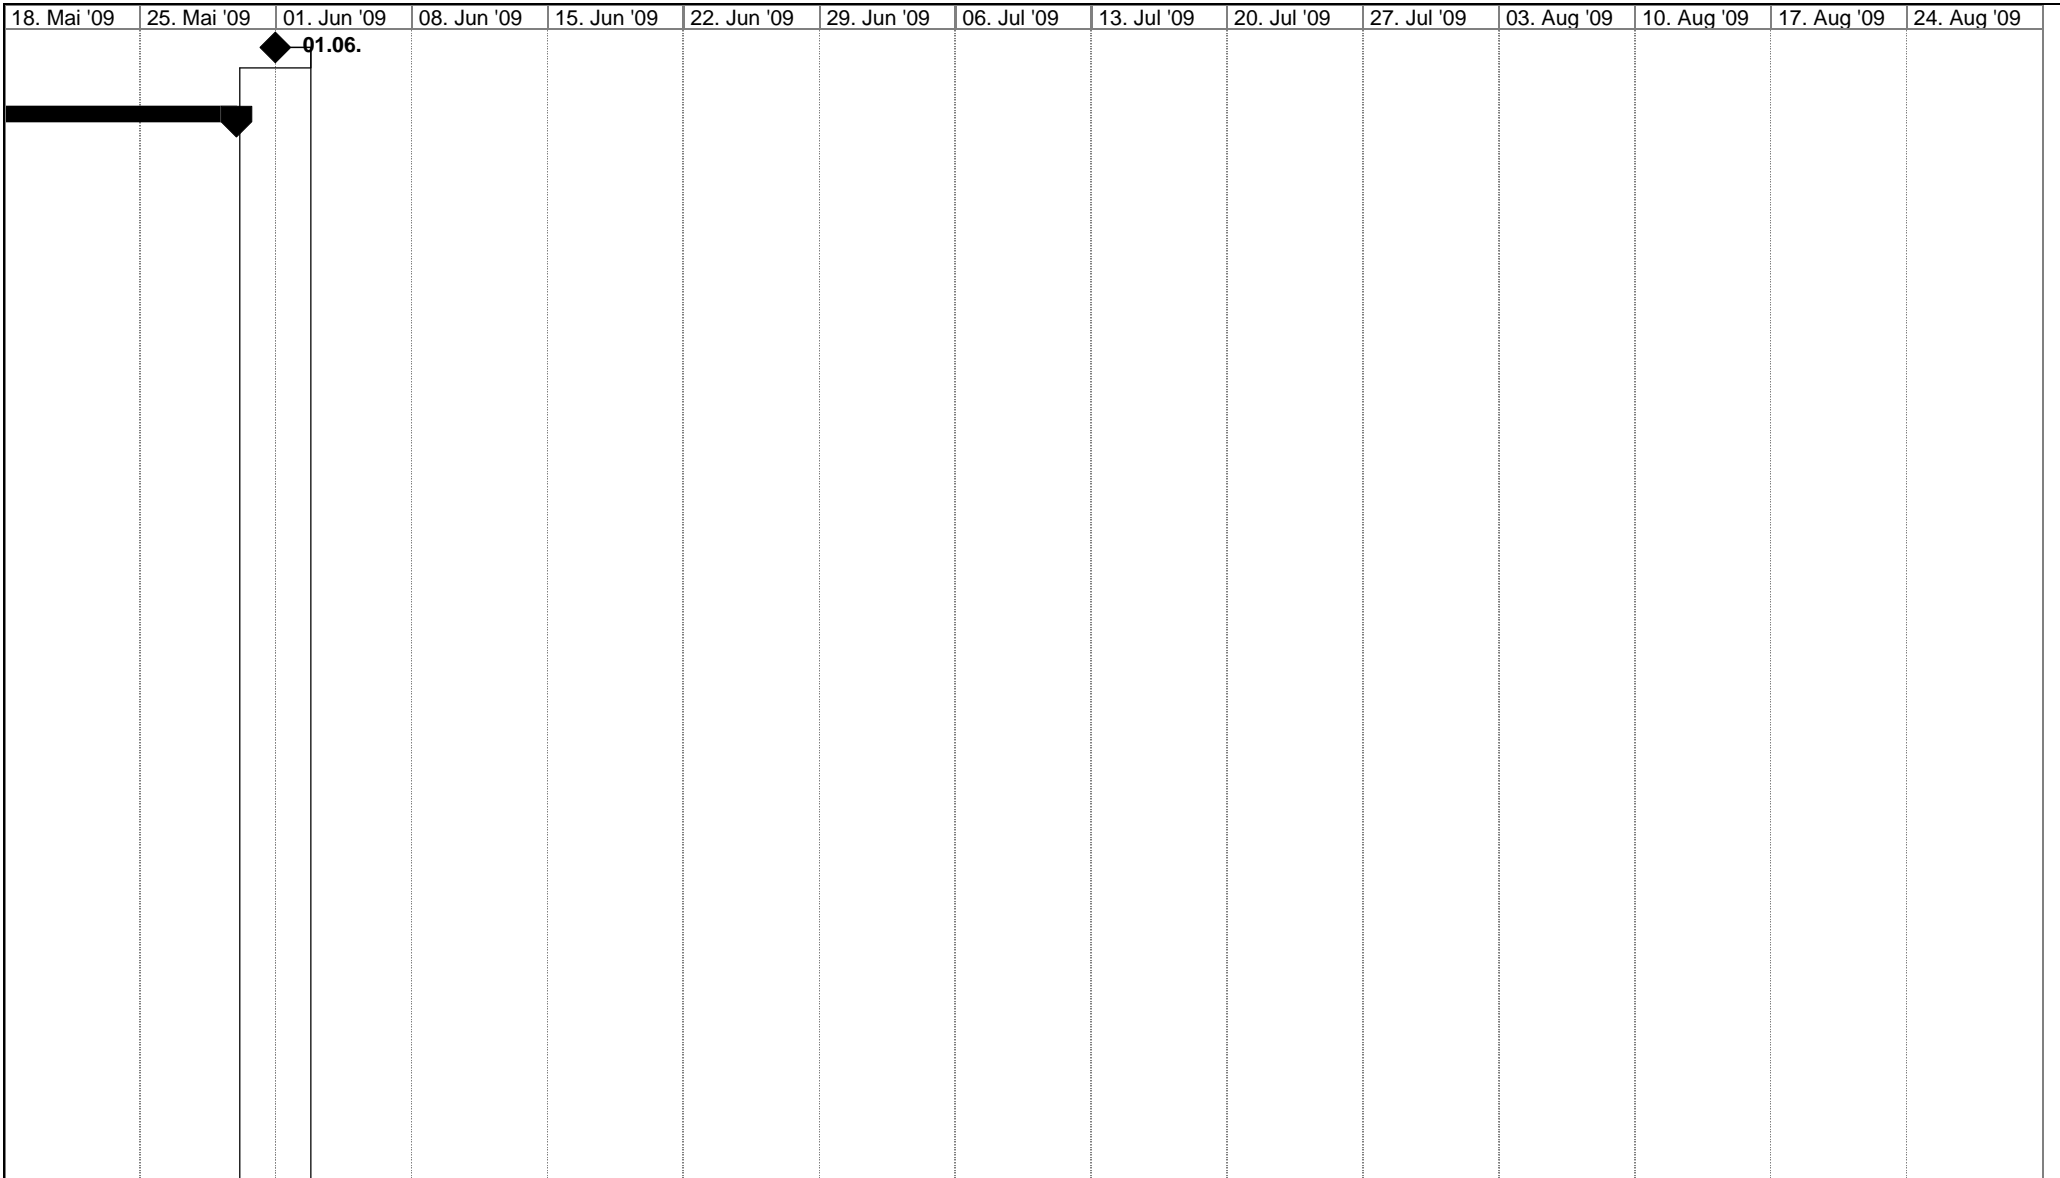


Projekt: Masterplan NewOrg 090415 Datum: Mo 20.04.09	Vorgang	Meilenstein	Externe Vorgänge
	Unterbrechung	Sammelvorgang	Externer Meilenstein
	In Arbeit	Projektsammelvorgang	Stichtag

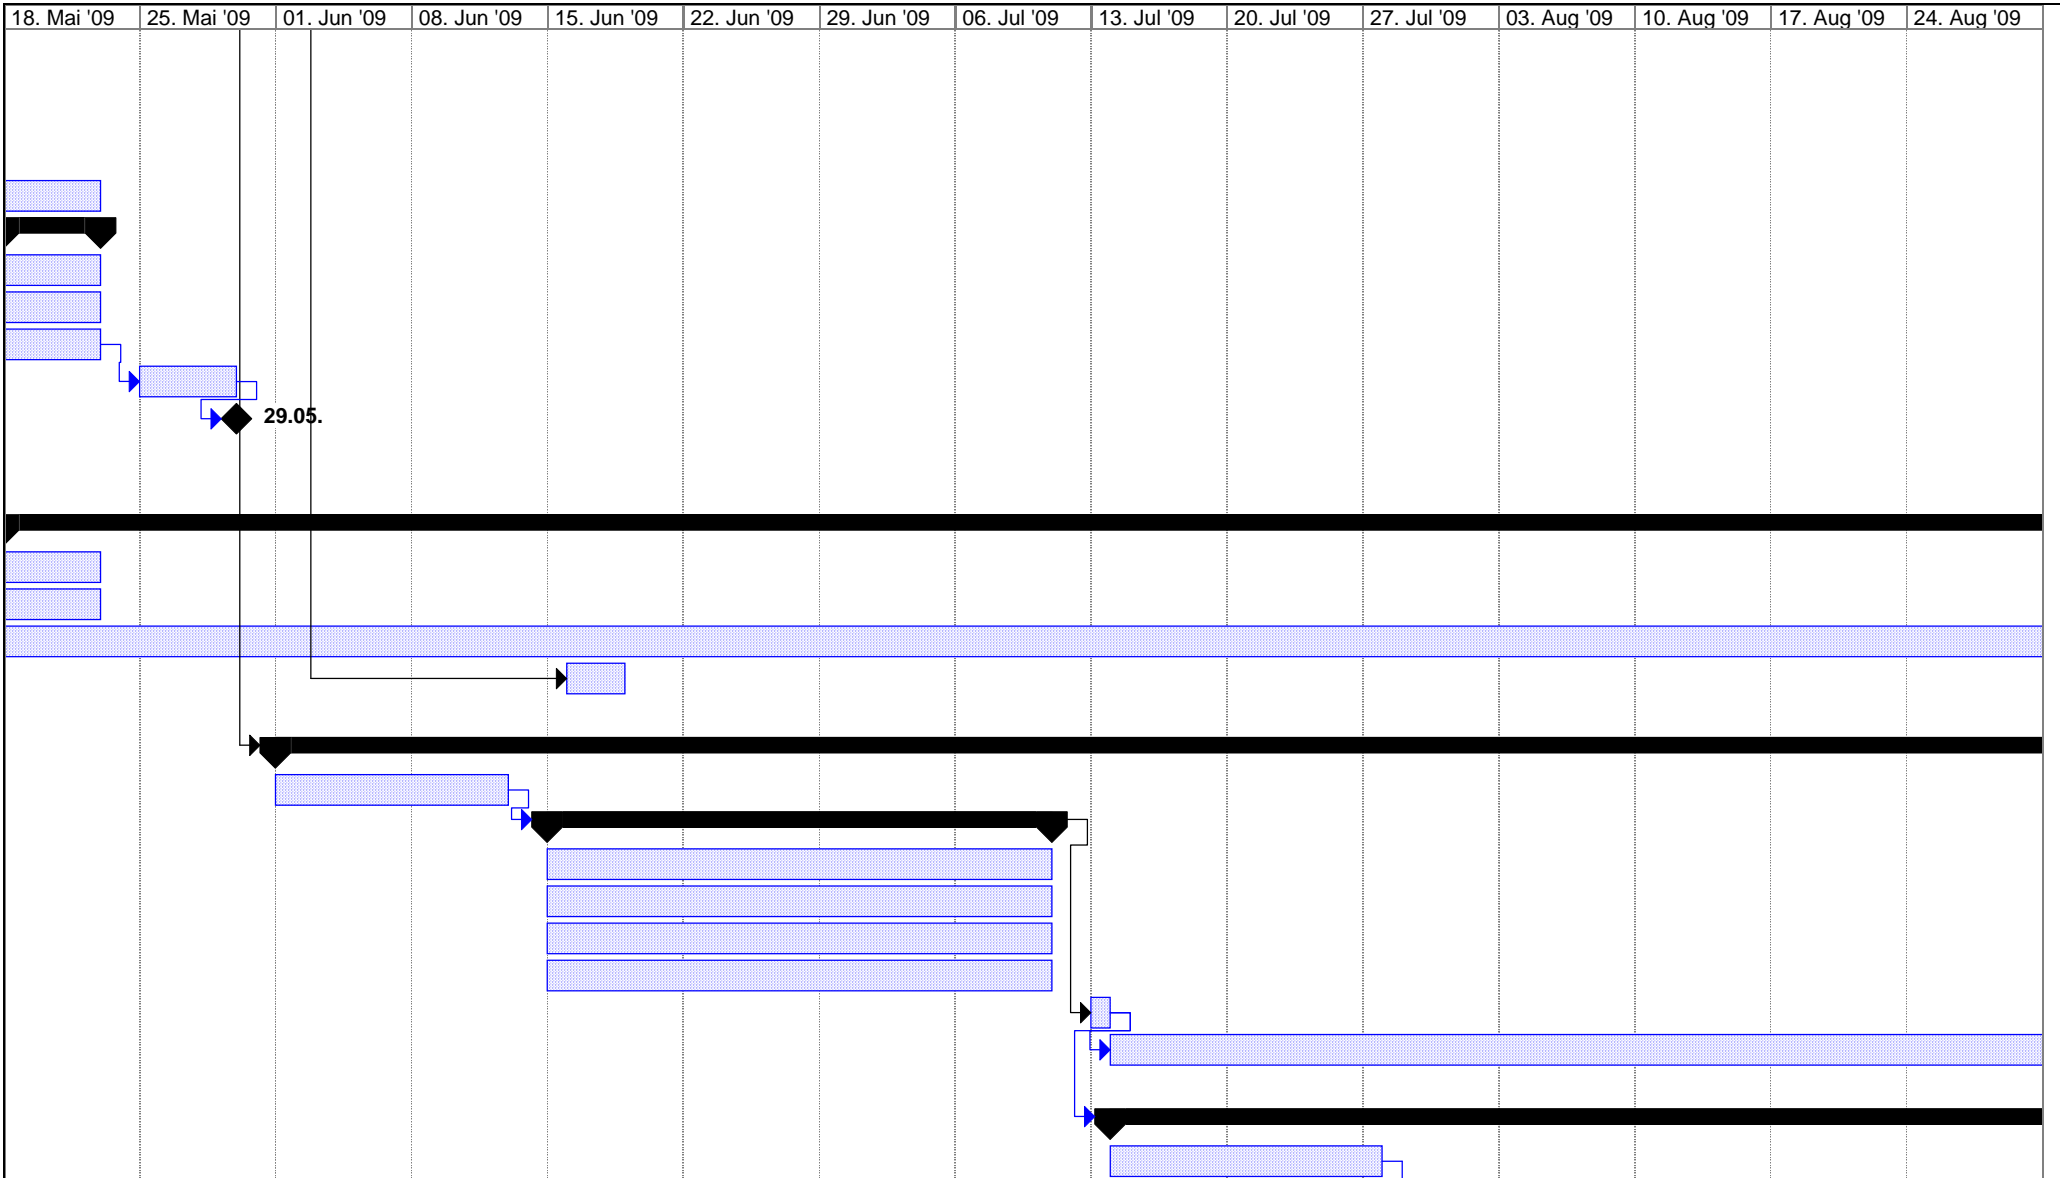

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

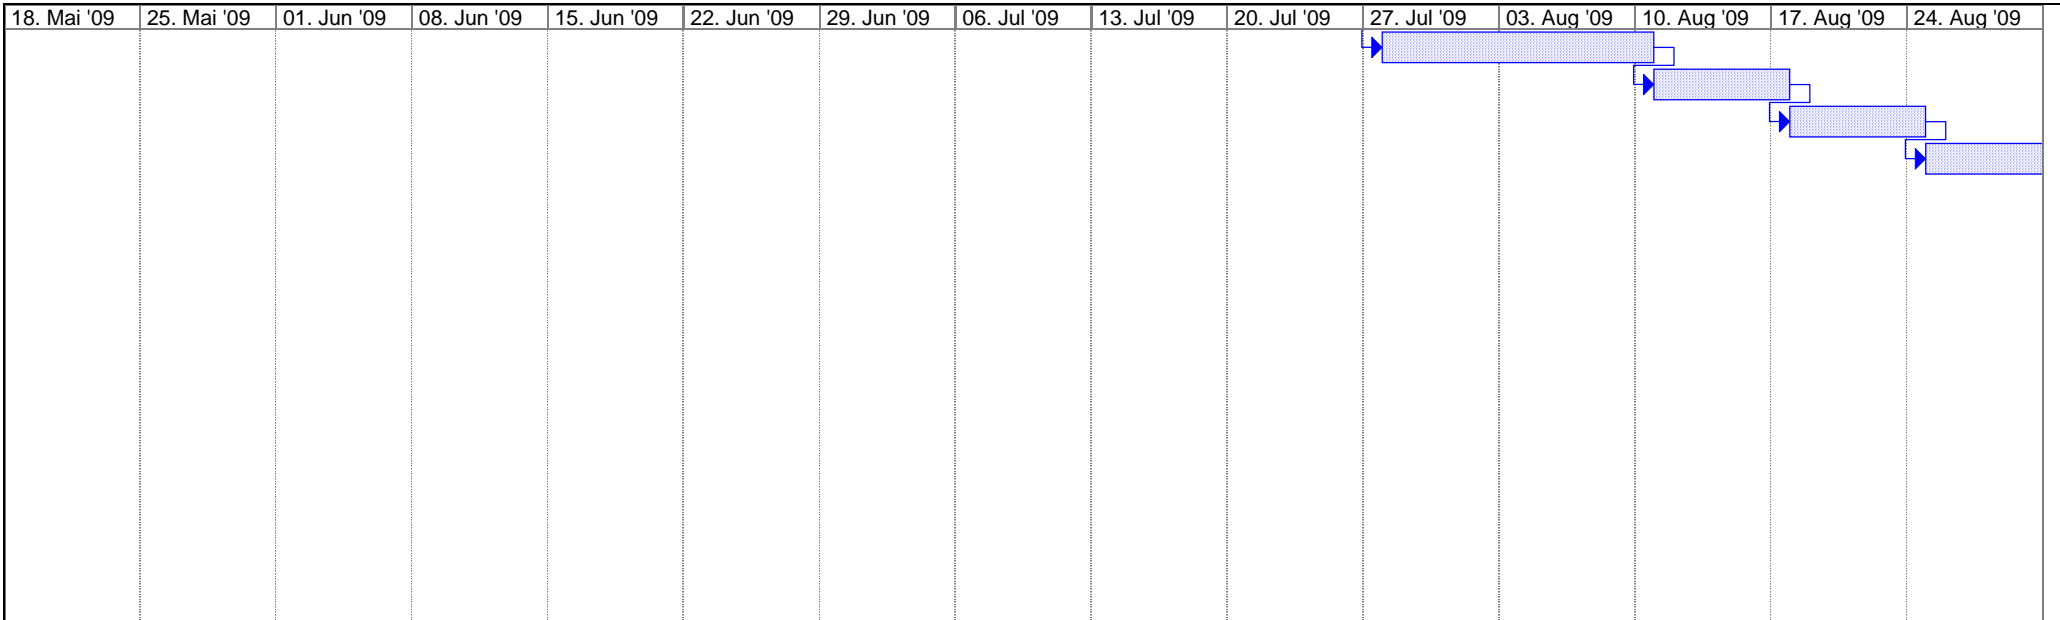


Projekt: Masterplan NewOrg 090415 Datum: Mo 20.04.09	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

31. Aug '09	07. Sep '09	14. Sep '09	21. Sep '09	28. Sep '09	05. Okt '09	12. Okt '09	19. Okt '09	26. Okt '09	02. Nov '09	09. Nov '09	16. Nov '09	23. Nov '09	30. Nov '09	07. Dez '09


Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

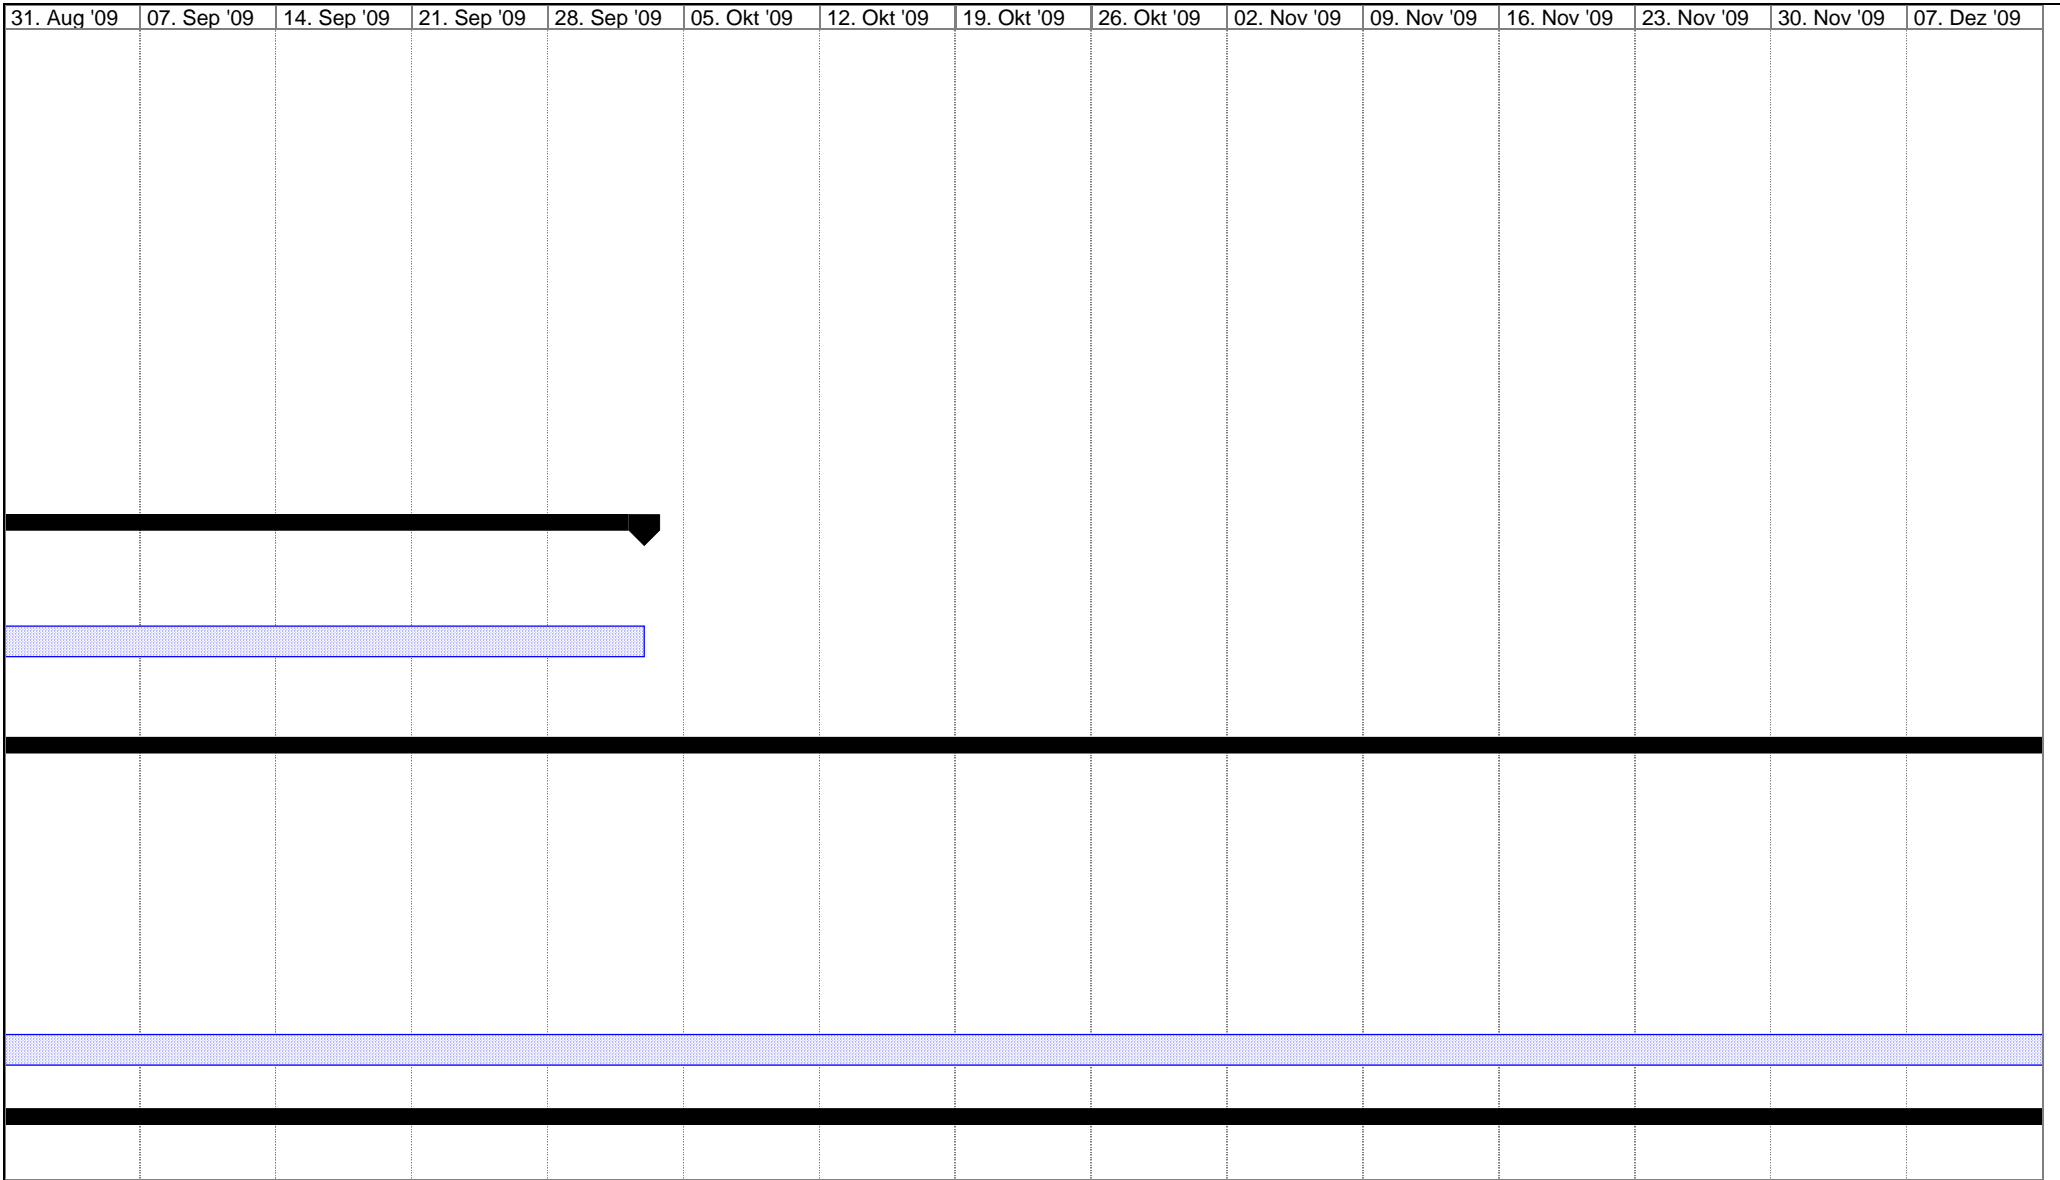

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

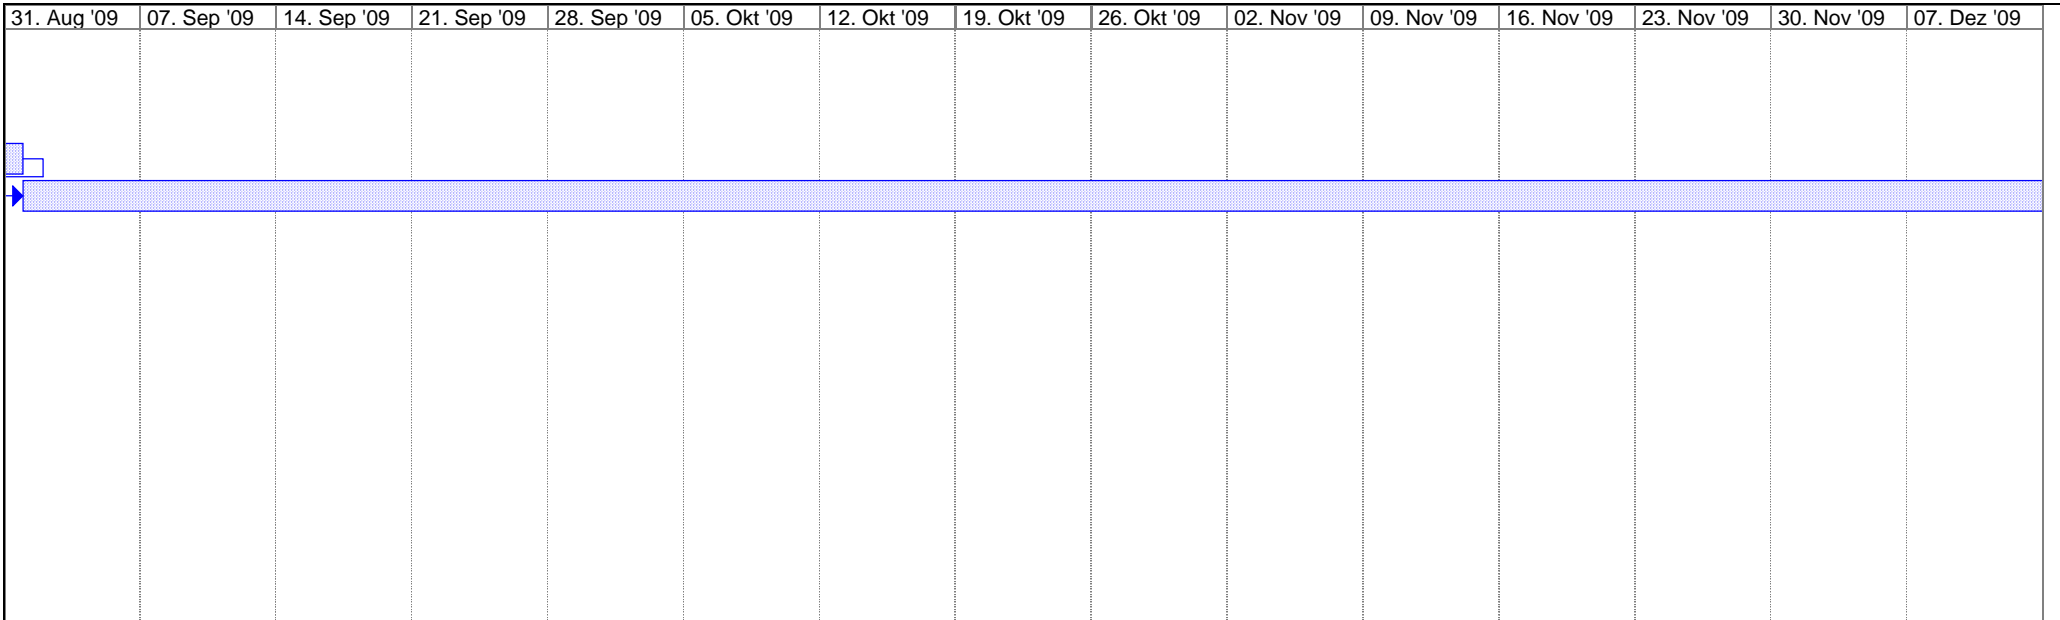


Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

14. Dez '09	21. Dez '09	28. Dez '09	04. Jan '10	11. Jan '10	18. Jan '10	25. Jan '10	01. Feb '10	08. Feb '10	15. Feb '10	22. Feb '10	01. Mrz '10	08. Mrz '10	15. Mrz '10	22. Mrz '10


Projekt: Masterplan NewOrg 090415
Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

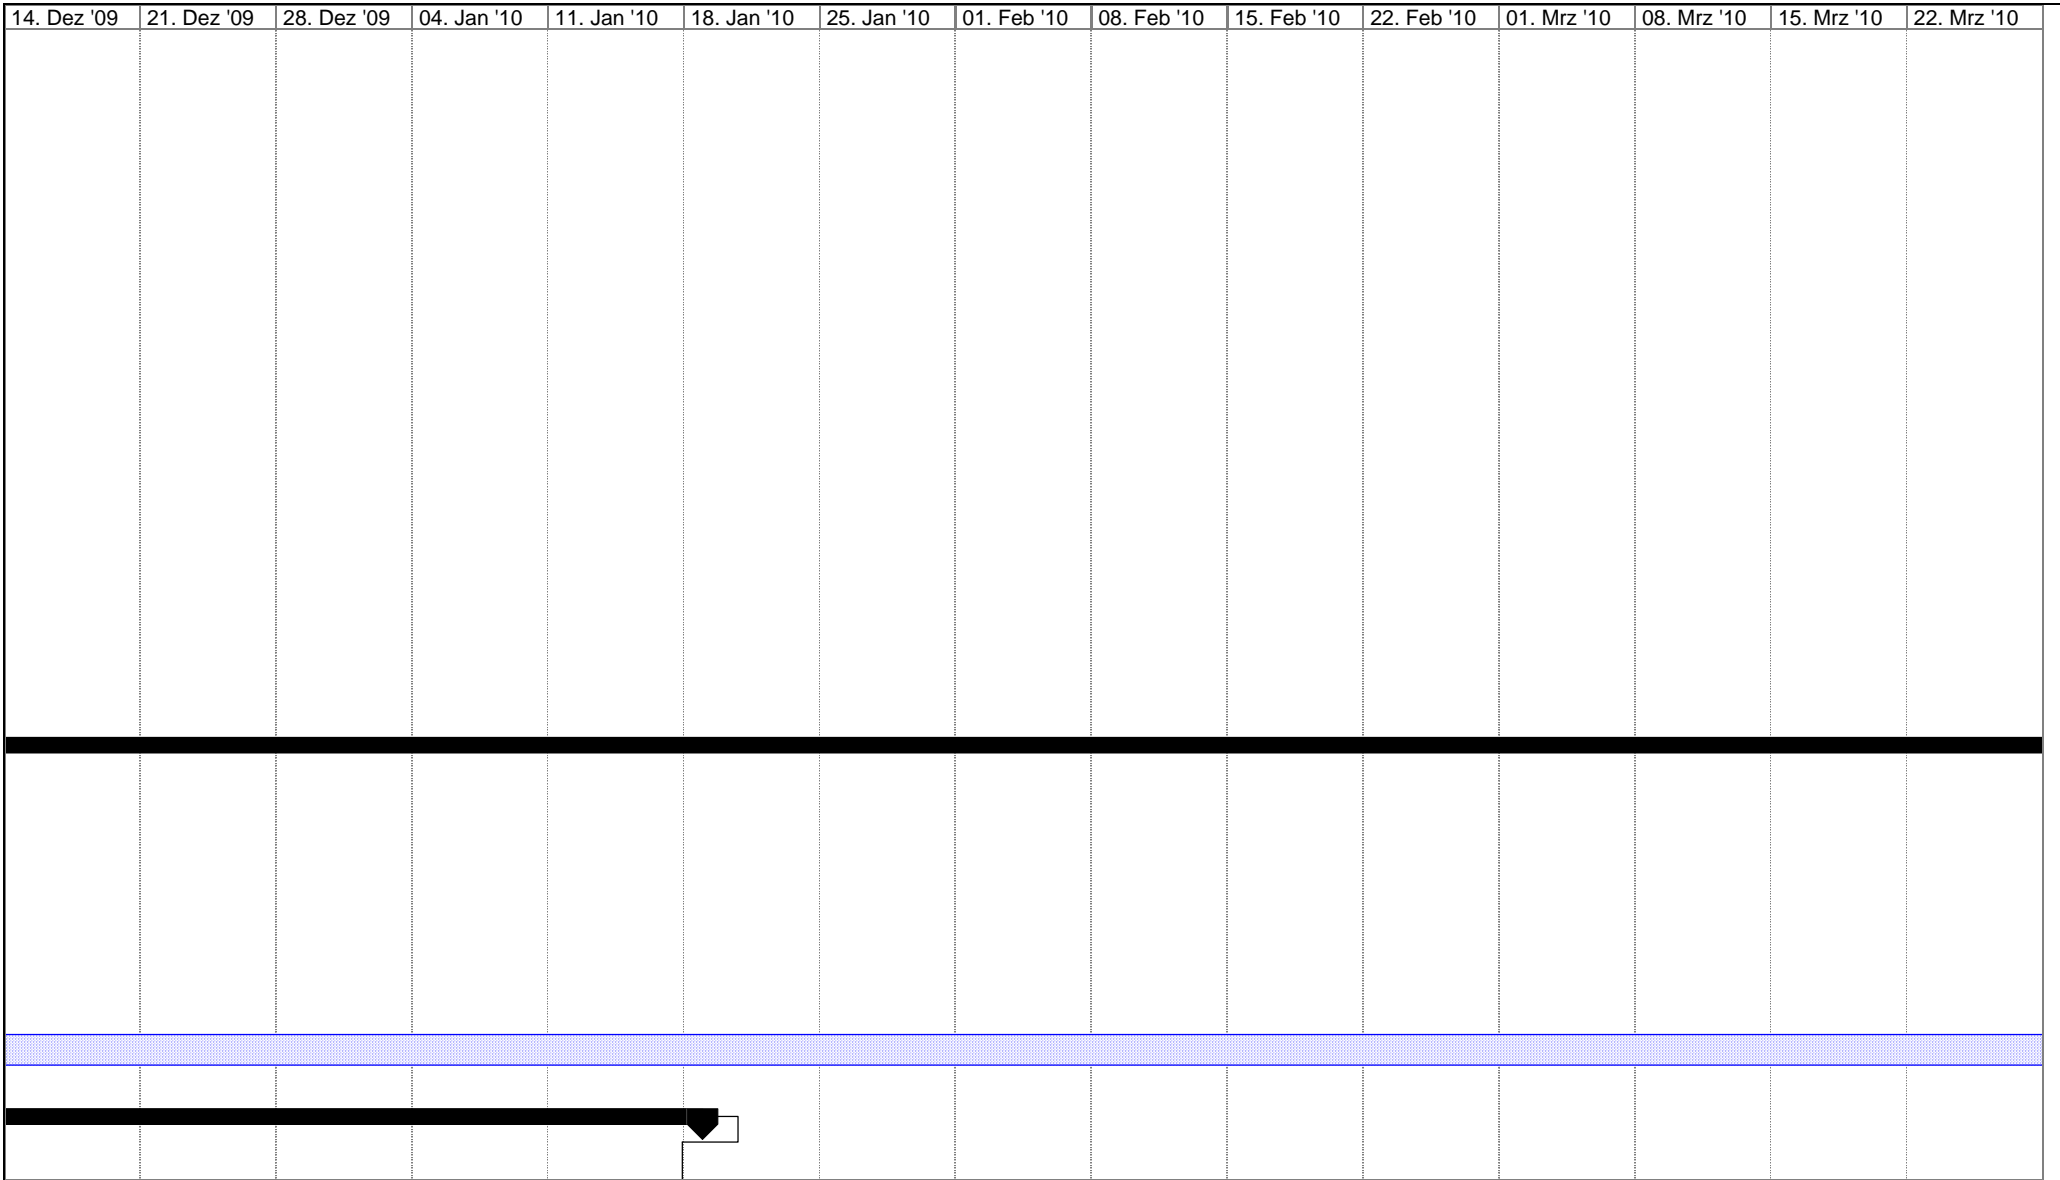

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

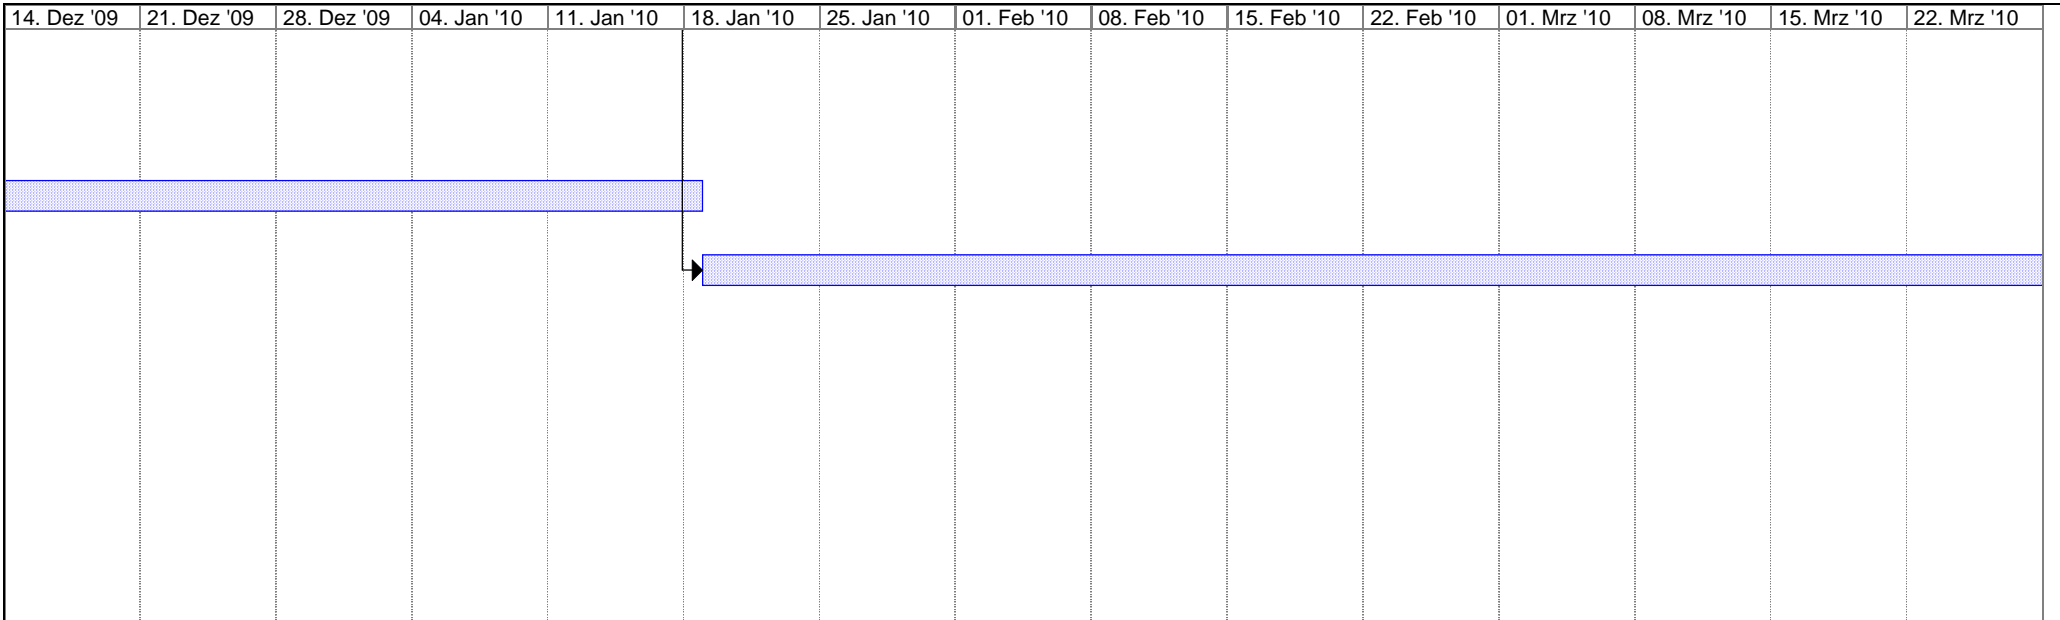

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09










Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

29. Mrz '10	05. Apr '10	12. Apr '10	19. Apr '10	26. Apr '10	03. Mai '10	10. Mai '10	17. Mai '10	24. Mai '10	31. Mai '10	07. Jun '10	14. Jun '10	21. Jun '10	28. Jun '10	05. Jul '10

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	


29. Mrz '10	05. Apr '10	12. Apr '10	19. Apr '10	26. Apr '10	03. Mai '10	10. Mai '10	17. Mai '10	24. Mai '10	31. Mai '10	07. Jun '10	14. Jun '10	21. Jun '10	28. Jun '10	05. Jul '10

Projekt: Masterplan NewOrg 090415 Datum: Mo 20.04.09	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

12. Jul '10	19. Jul '10	26. Jul '10	02. Aug '10	09. Aug '10	16. Aug '10	23. Aug '10	30. Aug '10	06. Sep '10	13. Sep '10	20. Sep '10	27. Sep '10	04. Okt '10	11. Okt '10	18. Okt '10

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09



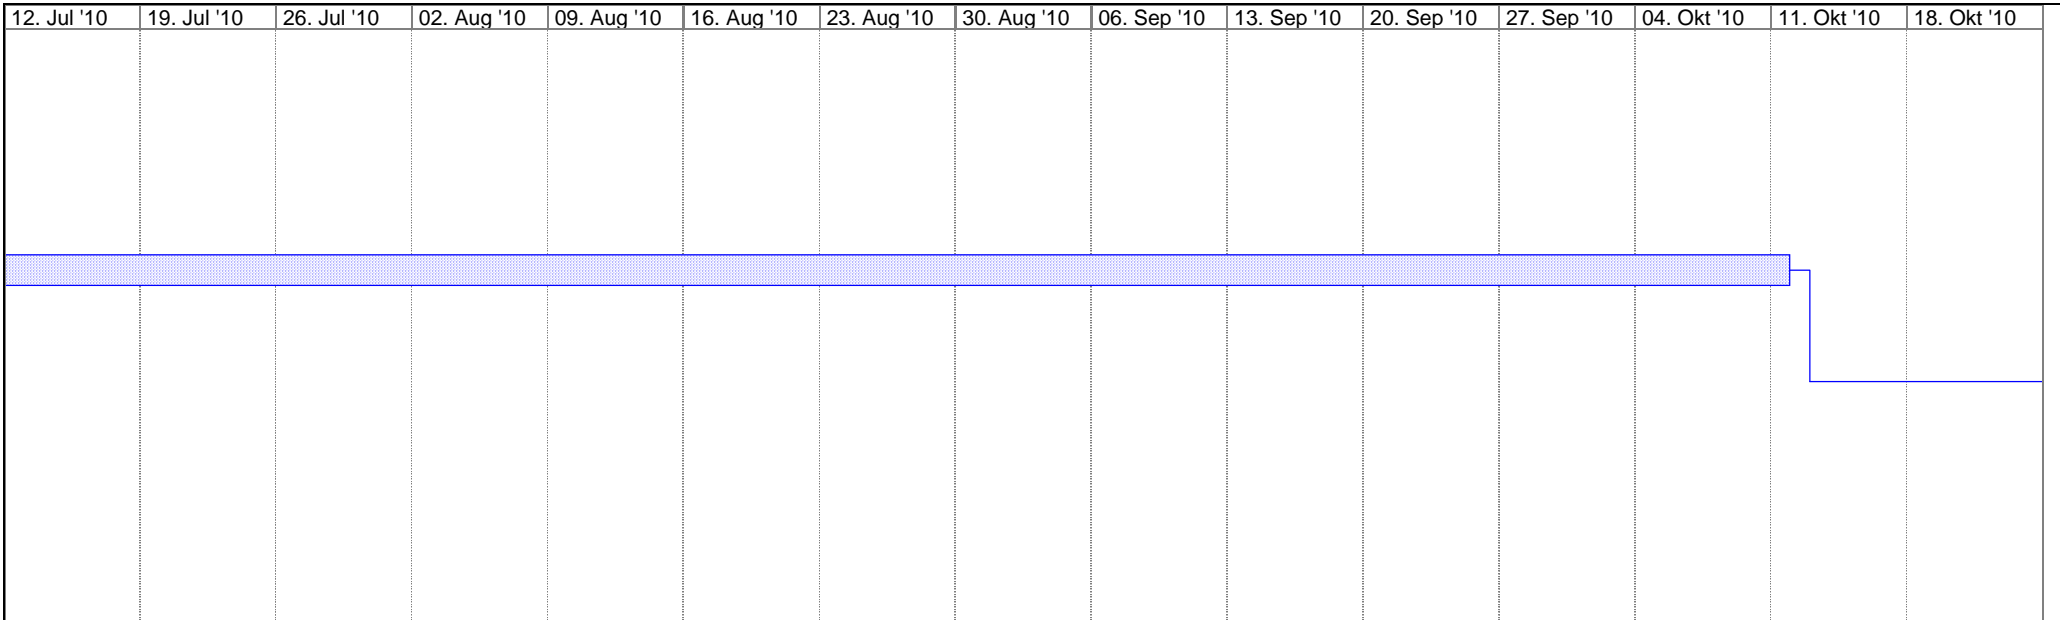






Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	




Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09


Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

25. Okt '10	01. Nov '10	08. Nov '10	15. Nov '10	22. Nov '10	29. Nov '10	06. Dez '10	13. Dez '10	20. Dez '10	27. Dez '10	03. Jan '11	10. Jan '11	17. Jan '11	24. Jan '11	31. Jan '11

Projekt: Masterplan NewOrg 090415 Datum: Mo 20.04.09	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

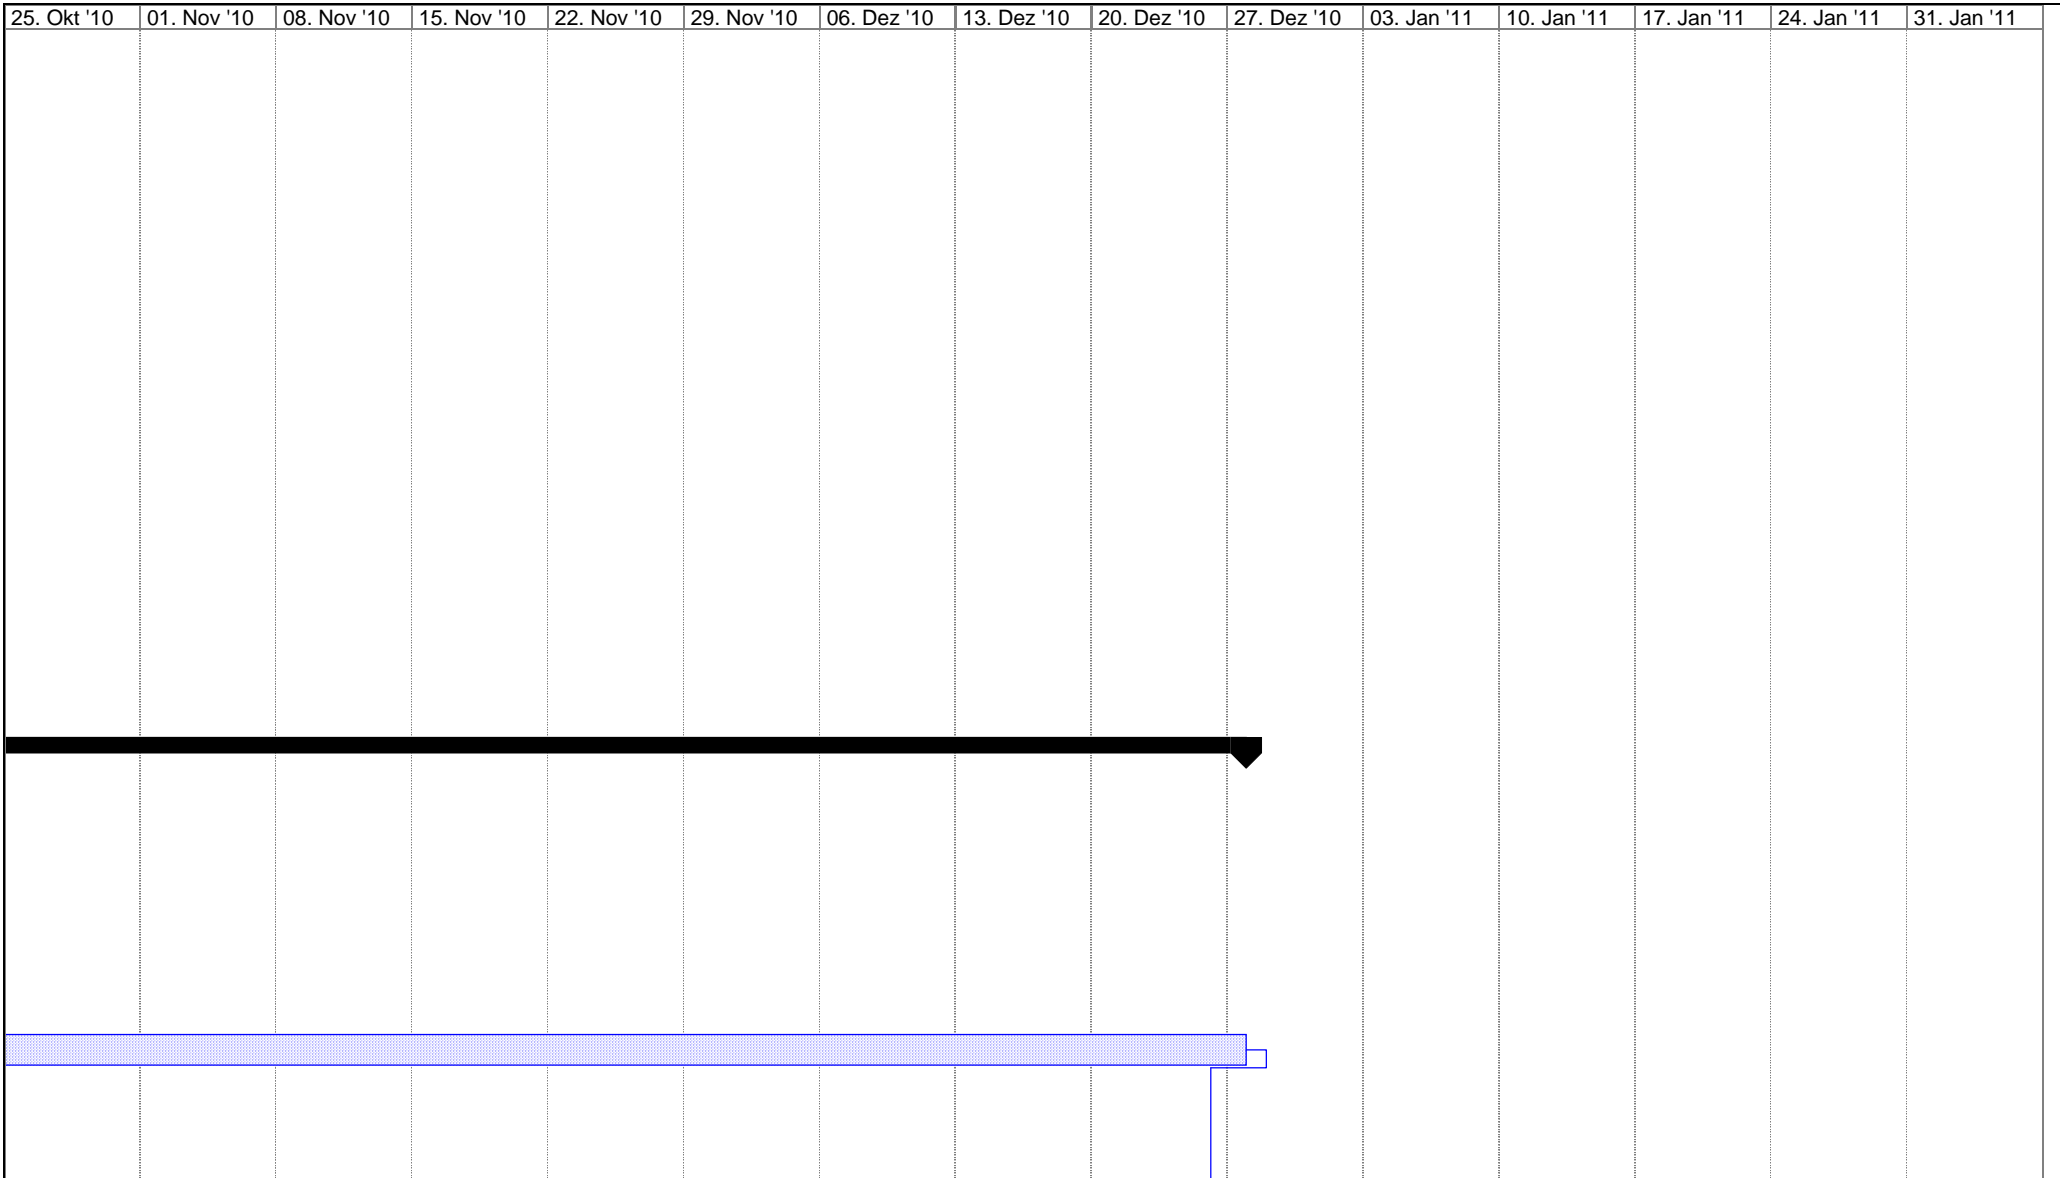

Projekt: Masterplan NewOrg 090415 Datum: Mo 20.04.09	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

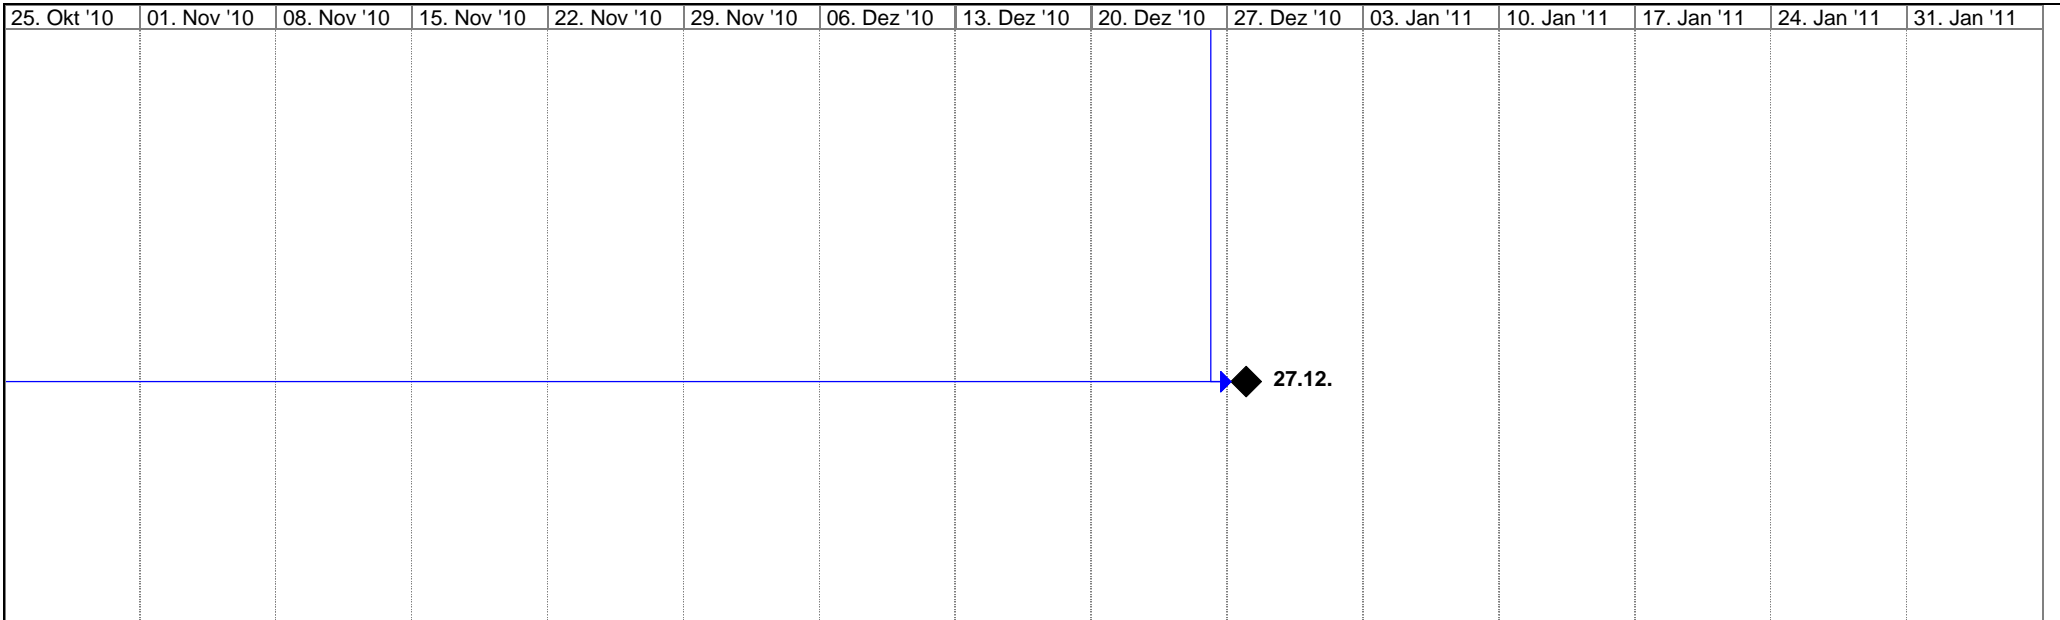

Projekt: Masterplan NewOrg 090415
 Datum: Mo 20.04.09

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	
